

**УТВЕРЖДЕН**  
 проектным комитетом Оренбургской  
 области по стратегическому  
 развитию и приоритетным проектам  
 (протокол от 23.05.2018 г. №3)

Паспорт приоритетного проекта  
 «Укрепление материально-технической базы организаций социального  
 обслуживания Оренбургской области»

I. Основные положения

Наименование направления	Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания
Краткое наименование приоритетного проекта	Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания Оренбургской области
Сроки начала и окончания реализации приоритетного проекта	01.01.2018–31.12.2018
Куратор приоритетного проекта	Вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике П.В. Самсонов
Старшее должностное лицо приоритетного проекта	–
Функциональный заказчик приоритетного проекта	Министерство социального развития Оренбургской области
Руководитель приоритетного проекта	Торукало Виктория Владимировна – первый заместитель министра социального развития Оренбургской области
Исполнители и соисполнители мероприятий приоритетного проекта	Министерство социального развития Оренбургской области Организации социального обслуживания населения Оренбургской области (далее – организации социального обслуживания)
Разработчик паспорта приоритетного проекта	Золотухин Андрей Александрович – начальник отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической базы подведомственных учреждений

II. Содержание приоритетного проекта

Цель приоритетного проекта	Улучшение условий социального обслуживания не менее 70% граждан пожилого возраста и инвалидов, от общего числа граждан, проживающих в организациях социального обслуживания, повышение уровня доступности социальных услуг не менее 3000 маломобильных граждан, граждан пожилого возраста инвалидов – до 31.12.2018 года			
Показатели приоритетного проекта и их значения	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение показателя	Срок достижения показателя
	количество	количество	6	2018 год
				10

по годам	организаций социального обслуживания, в которых будет укреплен материально-техническая база			
Ожидаемые результаты реализации приоритетного проекта	улучшение условий обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в организациях социального обслуживания, повышение доступности социальных услуг маломобильных граждан, граждан пожилого возраста и инвалидов			
Описание модели функционирования результатов приоритетного проекта	учитывая нормативные сроки службы конструкций и элементов жилых зданий, а также данные о материально-техническом состоянии подведомственных организаций, для реализации Программы министерством социального развития Оренбургской области ежегодно определяются полустационарные и стационарные организации социального обслуживания, в которых необходимо провести ремонтные работы, закупить автотранспорт, оборудование и предметы длительного пользования			

### III. Этапы и контрольные точки приоритетного проекта

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки приоритетного проекта	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта
1.	Проект инициирован. Паспорт проекта разработан.	контрольная точка результата	15.01.2018
2.	Паспорт проекта утвержден	контрольная точка завершения этапа	13.02.2018
3.	Приоритетный проект подготовлен (подготовлен сводный план реализации проекта)	контрольная точка результата	10.04.2018
4.	Сводный план проекта утвержден	контрольная точка завершения этапа	12.04.2018
5.	Приоритетный проект завершен (подготовлен итоговый отчет о реализации проекта)	контрольная точка завершения этапа	31.12.2018

### IV. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования		Год реализации
		2018
Бюджетные источники (млн. рублей)	федеральный бюджет	5,9
	областной бюджет	11,6
Итого		17,5

## V. Ключевые риски и возможности приоритетного проекта

№ п/п	Наименование риска приоритетного проекта	Наименование возможности приоритетного проекта	Мероприятия по предупреждению риска приоритетного проекта	Мероприятия по реализации возможностей приоритетного проекта
1.	Расторжение контрактов на выполнение ремонтных работ по инициативе любой из сторон; признание торгов несостоявшимися	Участие организаций социального обслуживания в зависимости от приоритетной потребности	Качественная и оперативная подготовка сметной документации (по ремонтным работам), мониторинг возможных поставщиков (при закупке автотранспорта, оборудования и предметов длительного пользования)	Улучшение качества условий проживания в организациях социального обслуживания населения; повышение доступности услуг, оказываемых комплексными центрами социального обслуживания для получателей социальных услуг, проживающих в отдаленных местностях Оренбургской области

## VI. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Оренбургской области	Государственная программа «Социальная поддержка граждан Оренбургской области» на 2014-2020 годы, подпрограмма № 5 «Старшее поколение», утверждена постановлением Правительства Оренбургской области от 30 августа 2013 года № 734-пп
Взаимосвязь с другими проектами и программами	Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2017 года № 1687 «О финансовом обеспечении социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»
Формальные основания для инициации и реализации приоритетного проекта	Заявка Правительства Оренбургской области на предоставление субсидии ПФР на финансовый год Выписка из Федерального закона «О бюджете

	Пенсионного фонда Российской Федерации» с указанием размера субсидии, распределенной Правительству Оренбургской области на текущий финансовый год
Дополнительная информация	Реализация проекта возможна при условии софинансирования с Пенсионным фондом Российской Федерации и позволит укрепить материально-техническую базу организаций социального обслуживания Оренбургской области Цели проекта достижимы при условии сохранения и увеличения уровня финансирования по соответствующей Государственной программе Оренбургской области

## Обоснование паспорта приоритетного проекта

### «Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания Оренбургской области»

#### 1. Обоснование приоритетного проекта

Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания является одним из важнейших направлений деятельности министерства социального развития Оренбургской области.

Поскольку большинство зданий организаций социального обслуживания располагаются в зданиях постройки 70-80 годов, существует постоянная необходимость поддерживать здания и строения в рабочем состоянии, что требует определенных финансовых затрат для проведения их ремонта.

В рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан Оренбургской области» на 2014-2020 годы выделяются бюджетные ассигнования из бюджета области для проведения мероприятий в рамках капитального ремонта, повышения уровня пожарной и антитеррористической безопасности.

Кроме того, ежегодно в рамках реализации социальной программы «Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания Оренбургской области и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» определяется перечень организаций, где будет проведен ремонт, приобретено оборудование и автотранспорт для мобильных бригад с учетом софинансирования из Пенсионного фонда.

В 2018 году с привлечением субсидии Пенсионного фонда Российской Федерации планируется провести ремонт в 3 организациях социального обслуживания, учитывая нормативные сроки службы конструкций и элементов жилых зданий, а также данные о материально-техническом состоянии зданий и сооружений. В 2018 году капитальный ремонт запланирован в следующих организациях социального обслуживания: ГБУСО «ГЦ «Долголетие», ГБУСО «РЦ «Бодрость» в г. Медногорске, ГАУСО «РОЦ «Русь», где особое внимание будет уделено вопросам капитального ремонта кровли жилых корпусов и внутренних систем отопления.


Учитывая значительную потребность в дополнительном автотранспорте для мобильных бригад организаций социального обслуживания Оренбургской области и стационарных организаций и нормативный срок службы автотранспорта, в 2018 году планируется приобрести легковые автомобили, оснащенные подъемником для перевозки маломобильных граждан и инвалидов в 4 организации социального обслуживания, 2 микроавтобуса для двух организаций социального обслуживания и 2 автобуса для перевозки детей к месту учебы и перевозки престарелых и инвалидов для получения дополнительных социальных услуг.

## II. Методика расчета показателей приоритетного проекта

№ п/п	Наименование показателя приоритетного проекта	Единица измерения	Временные характеристики показателя приоритетного проекта	Алгоритм формирования (формула)	Базовые показатели приоритетного проекта (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Охват единицы совокупности	Ответственный за сбор данных
1	Количество организаций социального обслуживания, в которых будет укреплена материально-техническая база	организаций	на: 01.04.2018 01.07.2018 01.10.2018 31.12.2018	$МБ = \frac{\sum ОР + \sum ОА}{\dots}$	МБ – количество организаций социального обслуживания, где будет укреплена материально-техническая база, $\sum ОР$ – общее количество организаций социального обслуживания, где будет проведен капитальный ремонт, $\sum ОА$ – общее количество организаций социального обслуживания, где будет приобретен автотранспорт для мобильных бригад	периодическая отчетность	сплошное наблюдение	министерство социального развития Оренбургской области

### III. Структурная декомпозиция результатов

#### приоритетного проекта

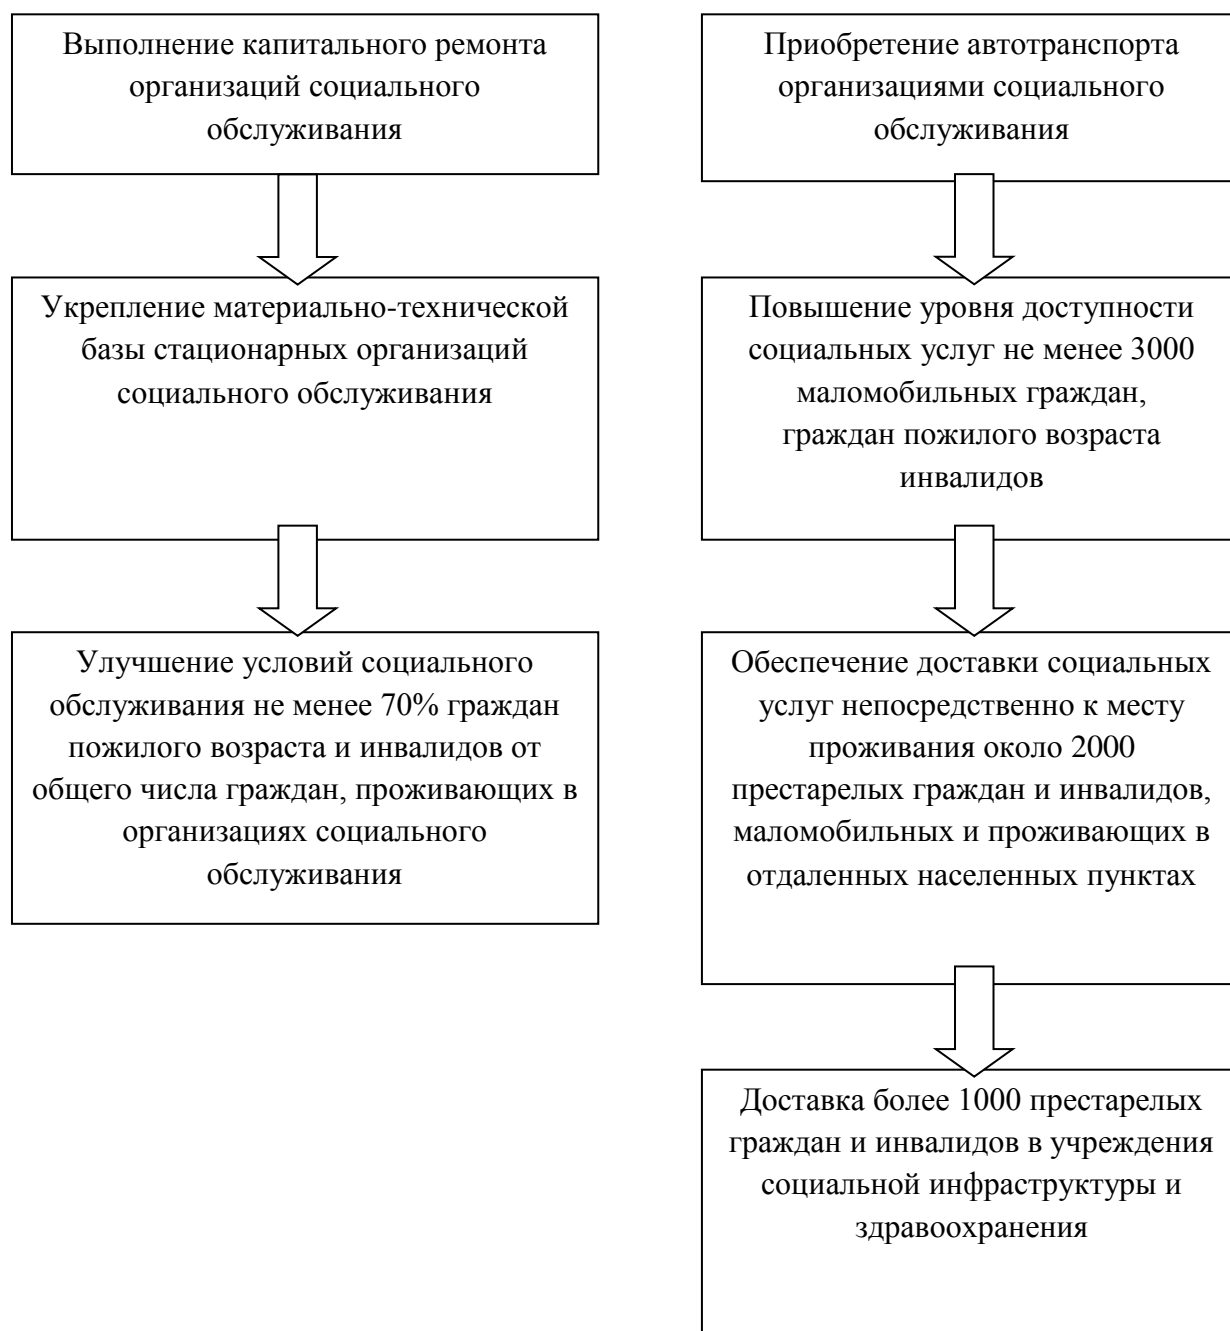

#### IV. Обоснование достижения показателей приоритетного проекта

Проект носит комплексный характер и направлен на формирование организационных, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов.

В 2018 году планируется укрепить материально-техническую базу не менее 10 организаций социального обслуживания: в ГБУСО «РЦ «Бодрость» в г.Медногорске»

и ГАУСО «РОЦ «Русь» планируется провести капитальный ремонт, в 7 организациях: ГБУСО «КЦСОН» в Южном округе, ГБУСО «КЦСОН» в Северном округе, ГБУСО «КЦСОН» в Матвеевском районе, ГАУСО «КЦСОН» в Адамовском районе, ГАУСО «КЦСОН» в г.Бузулуке и Бузулукском районе, ГАУСО «Орский ДИПИ «Надежда», ГБУСО «Гайский детский дом-интернат» планируется закупить автотранспорт для мобильных бригад, в ГБУСО «ГЦ «Долголетие» планируется привести капитальный ремонт и приобрести автотранспорт.

Все организации социального обслуживания ведут работу в целях реализации проекта: готовят сметную документацию для определения стоимости работ, собирают коммерческие предложения по автотранспорту для определения его средней стоимости.

В рамках проведения капитального ремонта организаций социального обслуживания сметная документация будет отправлена на государственную экспертизу, затем осуществлена подготовка конкурсной документации на торги.

По итогам торгов, где будет определен подрядчик, будет заключен контракт, определяющий срок и условия выполнения капитального ремонта.

Ход выполнения ремонтных работ должен быть проконтролирован руководителем организации социального обслуживания, по окончании работ – подписан акт выполненных работ за качество и объемы выполненных работ в соответствии со сметной документацией.

Акты выполненных работ подписываются при соблюдении всех условий контракта и оплачиваются после согласования с министерством социального развития Оренбургской области.

Реализация мероприятий в рамках капитального ремонта зависит от подрядчика, его добросовестности и соблюдения сроков и качества выполняемых работ.

В рамках приобретения автотранспорта для мобильных бригад организаций социального обслуживания, реализация проекта зависит от своевременной подготовки конкурсной документации на торги и добросовестности поставщика.

При условии соблюдения вышеназванных факторов мероприятия проекта будут реализованы во всех 10 организациях социального обслуживания.

#### V. Календарный план-график реализации приоритетного проекта

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки приоритетного проекта	Длительность этапа (дней)	Дата начала	Дата окончания	Результат приоритетного проекта	Ответственный исполнитель
1.	Проект инициирован. Паспорт проекта разработан.	46	01.12.2017	15.01.2018	Разработан паспорт приоритетного проекта	Министерство социального развития Оренбургской области
2.	Подготовка и утверждение социальной	50	01.12.2018	19.01.2018	Постановление Правительства	Министерство социального



	программы Оренбургской области				а Оренбургской области от 19.01.2018 № 19-п «О социальной программе «Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания Оренбургской области и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2018 году»,	развития Оренбургской области
3.	Паспорт приоритетного проекта подготовлен	30 дней	25.01.2018	10.04.2018	Согласование паспорта	Правительство Оренбургской области, министерство социального развития Оренбургской области
4.	Реализация приоритетного проекта	В течение 2018 года	09.01.2018	27.12.2018	Улучшение условий социального обслуживания престарелых граждан и инвалидов, проживающих в ГБУСО «ГЦ «Долголетие», ГБУСО «ГЦ «Бодрость» в г.Медногорске, ГАУСО «РОЦ «Русь»; повышение доступности	Министерство социального развития Оренбургской области, организации социального обслуживания Оренбургской области

					услуг, оказываемых комплексным и центрами социального обслуживания населения	
--	--	--	--	--	--	--

#### VI. Этапы и контрольные точки приоритетного проекта

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения контрольной точки проекта	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
1.	Паспорт приоритетного проекта разработан	контрольная точка завершения этапа	15.01.2018	Министерство социального развития Оренбургской области	Ведомственный проектный офис
2.	Паспорт приоритетного проекта утвержден	контрольная точка завершения этапа	13.02.2018	Правительство Оренбургской области, министерство социального развития Оренбургской области	Ведомственный проектный офис
3.	Подготовлен сводный план реализации проекта	контрольная точка результата	10.04.2018	Министерство социального развития Оренбургской области	Ведомственный проектный офис
4.	Сводный план проекта утвержден	контрольная точка завершения этапа	12.04.2018	Министерство социального развития Оренбургской области	Ведомственный проектный офис
5.	Приоритетный проект	контрольная точка	31.12.2018	Министерство социального	Ведомственный

	завершен, подготовлен итоговый отчет о реализации проекта	завершения этапа		развития Оренбургской области	проектный офис
--	---	---------------------	--	-------------------------------------	-------------------

#### VII. Реестр заинтересованных сторон

№ п/п	Наименование заинтересованной стороны	Представитель заинтересованной стороны	Ожидание от реализации приоритетного проекта
1.	Правительство Оренбургской области	Самсонов П.В., вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике	Улучшение качества получения социальных услуг, повышение уровня доступности социальных услуг
2.	Министерство социального развития	Самохина Т.В., министр социального развития Оренбургской области	Улучшение качества получения социальных услуг, повышение уровня доступности социальных услуг
3.	Организации социального обслуживания	Директора организаций социального обслуживания населения	Улучшение качества получения социальных услуг, повышение уровня доступности социальных услуг

#### VIII. Реестр рисков приоритетного проекта

№ п/ п	Наименование риска приоритетного проекта	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект	Ожидаемые последстви я	Мероприятия по регулирувани ю
1.	Расторжение контрактов на выполнение ремонтных работ	средний	средний	повторная подача заявки на торги	юридическое урегулирова- ние сторон
2.	Признание торгов несостоявшимися	средний	средний	повторная подача заявки на торги	–

#### IX. Реестр возможностей приоритетного проекта

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализации	Вероятность наступления	Уровень влияния
----------	-----------------------------	----------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------

	приоритетного проекта		возможностей		на проект
1	Участие организаций социального обслуживания в проекте в зависимости от приоритетной потребности проведения мероприятия	Улучшение качества социального обслуживания населения	Формирование потребности организаций социального обслуживания в капитальном ремонте и автотранспорте, определение первоочередных мероприятий для включения в проект	Представление заявок организаций социального обслуживания населения в министерство социального развития Оренбургской области	Средний

#### Х. Бюджет приоритетного проекта

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Наименование мероприятия	Бюджетные источники финансирования (млн. рублей)		Всего (млн. рублей)
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	
1.	Реализация мероприятий	Капитальный ремонт организаций социального обслуживания	3,1	2,4	5,5
		Приобретение автотранспорта (автомобили, оснащенные подъемником для перевозки маломобильных граждан и инвалидов и автобусы для перевозки детей и престарелых граждан и инвалидов)	2,8	9,2	12,0
	Итого по проекту:		5,9	11,6	17,5
